



REGISTRO TELEMÁTICO

JUSTIFICANTE DE ENTRADA EN REGISTRO

A fecha de jueves 7 noviembre 12:59:00 CET 2024 se ha efectuado, telemáticamente, el apunte que sigue en el LIBRO GENERAL DE REGISTRO DE ENTRADA de esta Entidad.

Datos Generales:

Nº Anotación	Fecha y Hora de Entrada	Fecha y Hora de Presentación
2024-122-E	07/11/2024 12:59	jueves 7 noviembre 12:59:00 CET 2024

Interesado/s:

Interesado	Documento	Relación
D/ DEPURACION PONIENTE ALMERIENSE UTE	Cif: U04419578	TITULAR
Domicilio	C.P.	Municipio (Provincia)
CALLE GONZALEZ GARBÍN Número 32	04001	ALMERIA (ALMERIA)

Asunto:

Asunto	Modalidad
CONSORCIO GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	INSTANCIA GENÉRICA
Extracto, Explicación	

Destinos de la anotación:

Destino
Secretaria

Documentos Aportados:

Nombre	Resumen Digital	Código de Verificación	Obl.
resumenSolicitud_406010776437811453.txt	0B20E2411782C2A9E55BCF69A53DA8BD4E7C1A43	6IK4E-7UTPL-OZYV6	SI
Solicitud genérica.PDF	80C3F5DCEB2B260D9D177F08221B5D90F44AD373	CXNLA-YFM10-1WGU0	SI
FINALIZACION_INVERSION_EBAR_PUENTE_DEL_RIO.p df	23C3FAF1A1A6C6F71C8013F75999CE9E874D7E21	DOSN7-7O6T0-1FR6J	NO

En Consorcio Gestión de Aguas Residuales a jueves 7 noviembre 12:59:00 CET 2024

De conformidad con lo establecido en el art. 16.3 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se extiende el presente justificante a los efectos de acreditación de presentación de documentos.



**ILMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DEL
PONIENTE ALMERIENSE. D. GABRIEL AMAT AYLLÓN**

Almería, 7 de noviembre de 2024

**Asunto: FINALIZACIÓN DE INVERSIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BOMBAS
SUSTITUTAS EN EBAR PUENTE DEL RÍO, ADRA**

Ilustrísimo señor:

Se informa de la finalización de la inversión consistente en sustitución de 2 bombas de elevación en EBAR Puente del Río, Adra.

Sin otro particular,

PARDO
ALONSO
PEDRO -
75228140Q

Firmado
digitalmente por
PARDO ALONSO
PEDRO - 75228140Q
Fecha: 2024.11.07
12:55:34 +01'00'

Pedro Pardo Alonso
Jefe de Servicio



Consortio del Ciclo Integral
del Agua del Poniente

SECTOR



PONIENTE



DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E.

Actuación EBAR PUENTE DEL RÍO, ADRA
INVERSIÓN: Suministro y colocación de 2 bombas sustitutas

SECTOR

Depuración Poniente Almeriense UTE


Noviembre 2024



Consortio del ciclo integral
del agua del Poniente

El objeto del presente escrito es informar de la finalización de la inversión consistente en sustitución de dos bombas en EBAR Ponte del Río.


Esta instalación se construyó y puso en marcha en 2012, para recoger el agua residual de las poblaciones aledañas (Ponte del Río y La Curva, en Adra) y enviarlas a la EDAR Adra para su depuración.

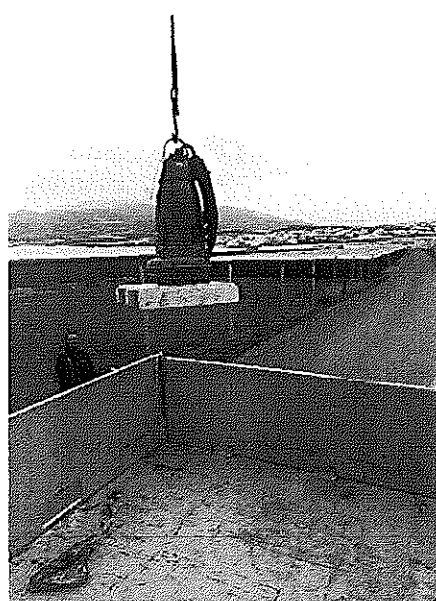

Proceso de colocación de ambas bombas en EBAR Ponte del Río

Con esta actuación se ha conseguido una mejora en el caudal de agua impulsado, pasando de los 145 (m³/h) de la actual de 7,5 KW a los 170 (m³/h) del modelo Flygt 3153-182 de 9 KW, del cual se adjuntan los datos técnicos en el Anexo 1.

Tras consulta con el Técnico asesor del Consorcio, se propuso en esta inversión la adquisición de 2 bombas sustitutas. La primera sería para instalación para uso inmediato por la deteriorada y la segunda sería para el momento en que la que queda en funcionamiento tuviese el mismo tipo de problemas, en previsión de dicho suceso en futuro cercano, al estar ambas sometidas a las mismas condiciones y tener las mismas horas de funcionamiento. Durante este mes de noviembre de 2024 ha sido instalada la segunda bomba debido al estado muy avanzado de deterioro de la bomba antigua que seguía instalada y sus averías y constantes.

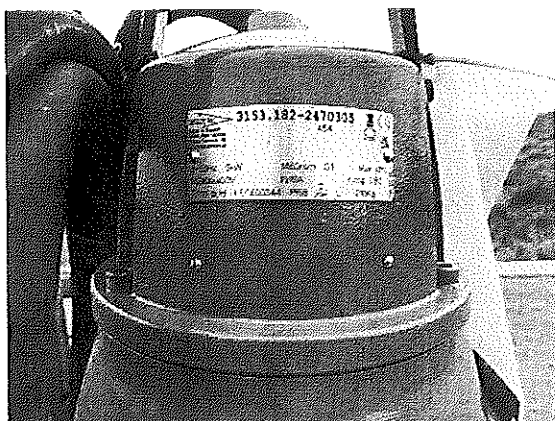

Placas de características de ambas bombas de EBAR Puente del Rio

Por todo lo anterior Informamos,

Finalizada la inversión de sustitución de dos bombas de impulsión en EBAR
Puente del Rio (Adra).

Sin otro particular,

Pedro Pardo Alonso
Jefe de servicio



Consorcio del Ciclo Integral
del Agua del Poniente

SECTOR



PONIENTE



DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E.


ANEXO 1: DATOS TÉCNICOS DE BOMBA FLYGT 3153-180

NP 3153 HT 3~454


Sistema de autoimpulsa del impulsor de canal semisubmerso, ideal para bombas de aguas residuales. Con posibilidad de añadir al sistema guido pin para mejorar la resistencia de posibles atascos. Un módulo asado en un diseño que permite la adaptación.



Especificaciones técnicas



Curva de acción: Agua, 1000 kg/m³, 4°C, 999,9 g/cm³, 1,3692 mm³/s

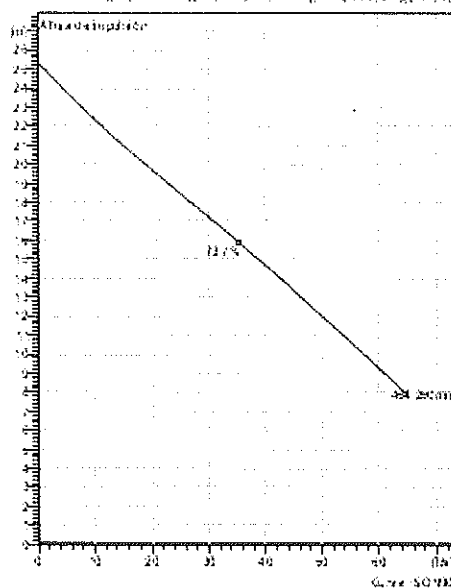

Normal (man) data show. Values and characteristics for this data should be specified due to standard manufacturing tolerances. Please consult your local Fluo representative for performance quantities.

Configuración

Motor number	Tipo de instalación
NP153.182.21.15.40A.W	P. Se modo manual, húmeda
9kW	
Impeller diameter	Dímetro de descarga
250 mm	100 mm

Información sobre la bomba

Dímetro del impulsor
250 mm
Discharge diameter
100 mm
Dímetro interno
150 mm
Maximum operating speed
1460 rpm
Número de pasos
2

Material

Rotary
Functioning

Temp. máx. fluido
40 °C

NP 3153 HT 3~ 454

Especificaciones técnicas Motor - General



Motor number N3153.182 21-15-4AA-W 9KW	Fases 3~	Velocidad nominal 1460 rpm	Potencia nominal 9 kW
Certificación ATEX No	Nº de polos 4	Corriente nominal 19 A	Volante de inercia 1
Frecuencia 50 Hz	Tensión nominal 400 V	Clase de aislamiento H	Tipo de servicio S1
Código de la versión 182			

Motor - Técnica

Factor de potencia - 1/1 Carga 0,80	Rendimiento del motor - 1/1 Carga 86,2 %	Momento de inercia total 3,08 kg.m ²	Máx. arranques / h 30
Factor de potencia - 3/4 carga 0,74	Rendimiento del motor - 3/4 carga 87,2 %	Corriente arranque, arranque directo 10,7 A	
Factor de potencia - 1/2 Load 0,61	Rendimiento del motor - 1/2 Load 86,6 %	Corriente arranque, arranque estrella-triángulo 15,7 A	


NP 3153 HT 3~454

Curva de rendimiento

Punto de funcionamiento


Cayd

Aluna imediata

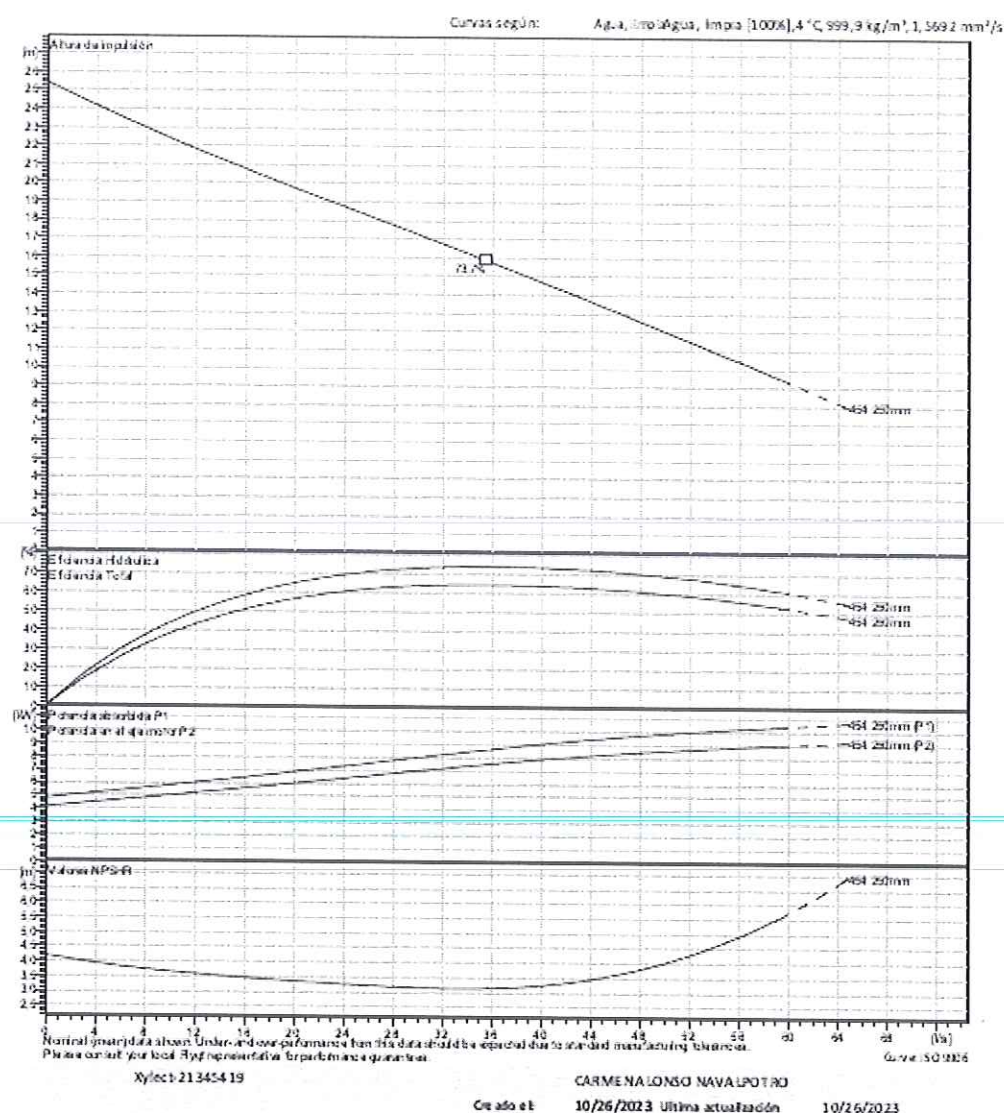

NP 3153 HT 3~454

Análisis de la carga

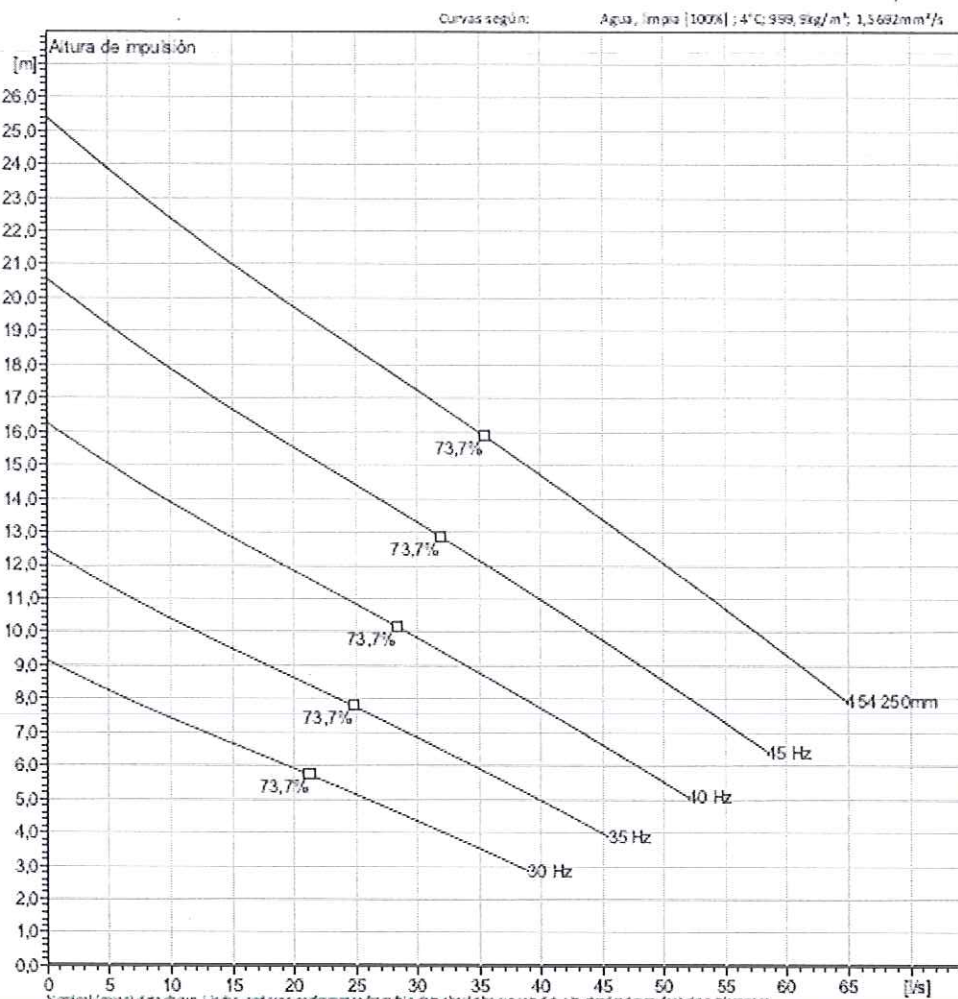

Normal (main) data shown. Under- and over-performance from this data should be expected due to standard manufacturing tolerances.
Please consult your local Flygt representative for performance guarantees.
