Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		***RED DE PLUVIALES Y CÁMARA TORMENTAS DE PLAYA SERENA, ROQUETAS DE MAR.***	**242 días**	**lun 04/01/16**	**mar 06/12/16**		**4.165.924,74 €**
2		Inicio de las obras	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16		0,00 €
3		Trabajos Previos	30 días	lun 04/01/16	vie 12/02/16		7.966,57 €
4		**TUBERIAS, POZOS E IMBORNALES**	**144 días**	**lun 15/02/16**	**jue 01/09/16**		**626.316,55 €**
5		Colectores Pluviales	120 días	lun 15/02/16	vie 29/07/16	3	505.685,86 €
6		Impulsión Terrestre	44 días	lun 04/07/16	jue 01/09/16	5FC-20 días	101.093,19 €
7		Arqueta Cuadrada	25 días	mié 08/06/16	mar 12/07/16	5FC-38 días	19.537,50 €
8		**CÁMARA DE TORMENTAS**	**194 días**	**lun 04/01/16**	**jue 29/09/16**		**2.116.317,07 €**
9		**Trabajos previos**	**20 días**	**lun 14/03/16**	**vie 08/04/16**		**54.476,83 €**
10		Demoliciones	5 días	lun 14/03/16	vie 18/03/16	3	70,00 €
11		Despeje y Desbroce	7 días	mar 22/03/16	mié 30/03/16	10	4.779,00 €
12		Movimiento de Tierras	14 días	mar 22/03/16	vie 08/04/16	10	49.627,83 €
13		**Muro Pantalla**	**77 días**	**jue 07/04/16**	**vie 22/07/16**		**1.152.223,70 €**
14		Muro Pantalla	67,75 días	jue 07/04/16	dom 10/07/16	12FC-8 días	1.003.422,67 €
15		Anclajes	10 días	lun 11/07/16	vie 22/07/16	14	148.801,03 €
16		**Estructura**	10 días	lun 04/01/16	vie 15/01/16		798.953,40 €
17		**Impermeabilización y Varios**	8 días	lun 19/09/16	mié 28/09/16	14	108.108,16 €
18		**Losa de Transición**	9 días	lun 19/09/16	jue 29/09/16	14	2.554,98 €
19		**ALIVIADERO SUBMARINO**	**34 días**	**lun 03/10/16**	**jue 17/11/16**		**255.630,11 €**
20		Movimiento de Tierras	18 días	lun 03/10/16	mié 26/10/16		97.955,21 €
21		Tuberías	15,88 días	lun 03/10/16	lun 24/10/16	20CC	69.972,84 €
22		Obras Complementarias	19 días	lun 24/10/16	jue 17/11/16	21FC-5 días	87.702,06 €
23		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELECONTROL**	**232 días**	**lun 04/01/16**	**mar 22/11/16**		**167.803,25 €**
24		Linea de Media Tensión	15 días	lun 04/01/16	vie 22/01/16		50.428,52 €
25		Caseta Grupo Electrógeno	18 días	lun 04/01/16	mié 27/01/16	24CC	56.364,17 €
26		Centro de Transformación	12 días	jue 28/01/16	vie 12/02/16	25	41.057,27 €
27		Linea de Baja Tensión	16 días	lun 25/01/16	lun 15/02/16	24	8.191,53 €
28		**Telecontrol**	**27 días**	**lun 17/10/16**	**mar 22/11/16**		**11.761,76 €**
29		Cuadro de Telecontrol	18 días	lun 17/10/16	mié 09/11/16		5.162,20 €
30		Instalación de campo	7 días	jue 10/11/16	vie 18/11/16	29	2.724,20 €
31		Programación y Puesta en marcha	0 días	vie 18/11/16	vie 18/11/16	30	3.875,36 €
32		**E.B.A.P.**	**28 días**	**mié 26/10/16**	**vie 02/12/16**		**192.140,44 €**
33		Obra Civil	10 días	mar 01/11/16	lun 14/11/16		6.812,90 €
34		Equipamiento	6 días	mar 15/11/16	mar 22/11/16	33	171.549,13 €
35		Vallado	6 días	mié 16/11/16	mié 23/11/16	34FC-5 días	13.778,41 €
36		**PAVIMENTACIONES**	85 días	mar 09/08/16	mar 06/12/16	7	560.121,81 €
37		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**	19,75 días	mié 09/11/16	mar 06/12/16	35FC-11 días	94.490,46 €
38		**MEDIDAS DE PREVENCIÓN/PROTECCIÓN AMBIENTAL**	242 días	lun 04/01/16	mar 06/12/16	3CC	5.649,80 €
39		**ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS**	242 días	lun 04/01/16	mar 06/12/16	3CC	113.006,47 €
40		**SEGURIDAD Y SALUD**	242 días	lun 04/01/16	mar 06/12/16	3CC	26.482,21 €

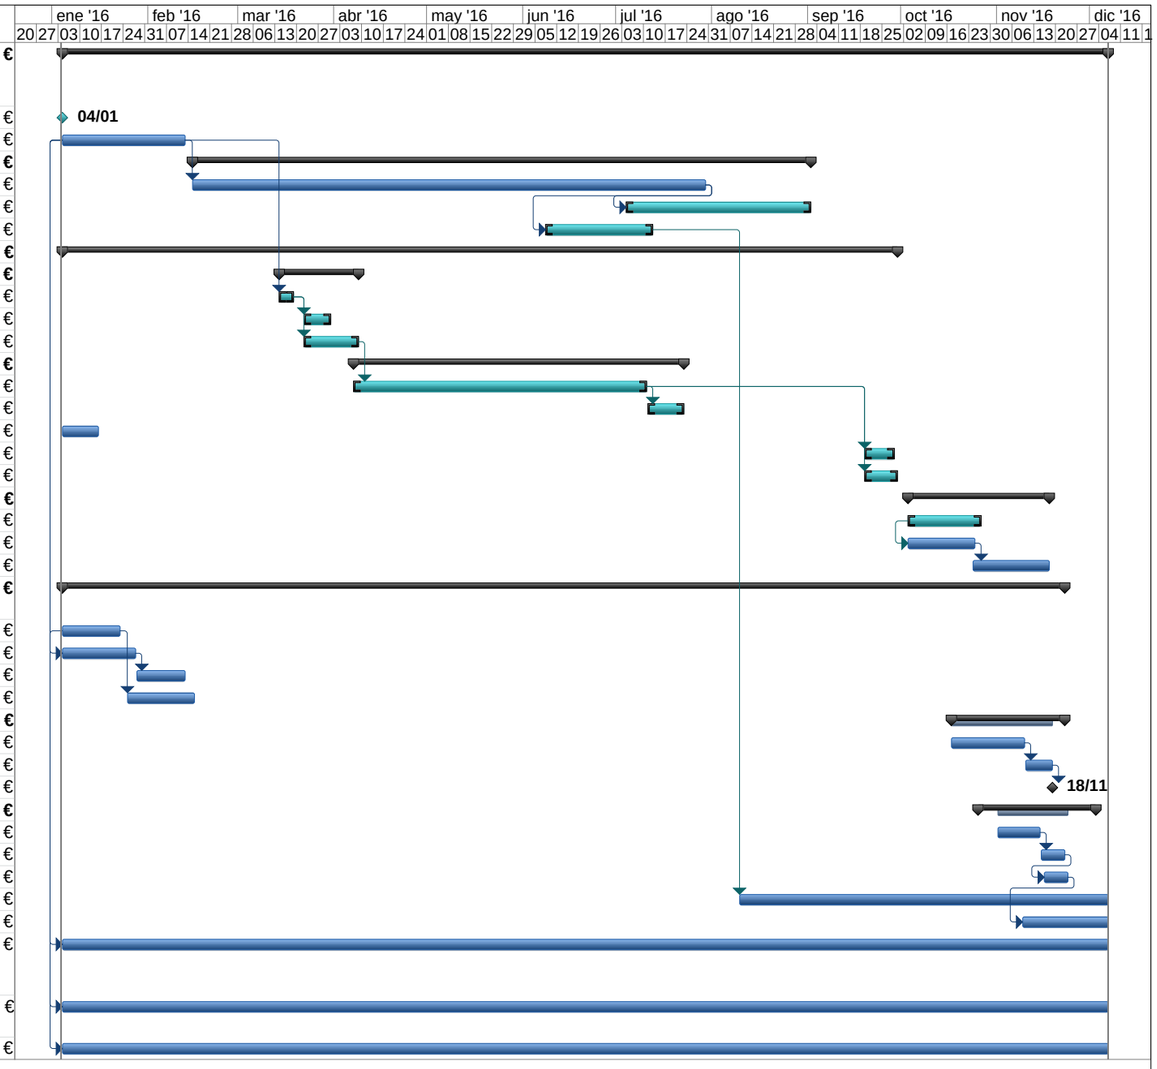

Red de Pluviales y Cámara
de Tormentas en Urb. Playa Serena, T.M. Roquetas de Mar.
Septiembre 2016

Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Fecha límite	
División		Tareas externas		Resumen inactivo		Resumen manual		Progreso	
Hito		Hito externo		Tarea manual		Sólo el comienzo			
Resumen		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin			
